

KNOWLEDGE PLATFORM ROADMAP

도구 도입이 아닌 AI 지식 전파·축적 운영 체계

OPERATING MODEL

ACCESS · OWNER · MEASURE

RAW COMMITTER

PM INGEST

PUBLISHED WIKI

2026 H2 OPS

KIMM-SNS · GPU · LLM WIKI · DATA

2026 H2

EXECUTION

3 tracks

SNS · GPU · WIKI

2027

BUILD PLAN

오늘 공유할 것

확정 / 검토 / 요청을 분리

하반기 MVP 범위, 운영 원칙, 연구자
입력 지점 우선 정렬

1

무엇을 먼저 만들 것인가

KIMM-SNS / 공용 GPU / LLM위키: 하반기 MVP 범위

2

어떻게 굴러가게 할 것인가

계정·권한·지원·측정: 공통 운영 규칙

3

2027 자체사업을 어떻게 준비할 것인가

활용도·재사용성·수요 데이터: 예산 요구 근거

오늘 계획의 주체

지식플랫폼팀의 위치와 역할

AX가속화연구단 3개팀 중 기술·
인프라 기획·구축 실행팀

3 TEAMS

AX혁신팀 · 지식플랫폼팀 · AX내재화팀

35명 내외

연구단 전체 인원 규모

AX혁신팀

부서 단위 AX
실행 촉진

아이템 발굴, 교육,
멘토링으로 현장의
실행 과제를
밀어줍니다.

지식플랫폼팀

AI 지식과 인프라
가 흐르는 기반

KIMM-SNS, LLM위키, AI-
Ready 데이터, 공용
인프라를 하나의 운영
체계로 묶습니다.

KIMM-SNS

LLM위키

AI-Ready

인프라

AX내재화팀

기여와 성과의
제도화

크레딧, 보상, 평가
연계로 AX 활동이
지속되도록
만듭니다.

핵심 질문

AI 지식이 흩어지지 않게 하려면

원내 AI 도구는 이미 존재. 문제는
위치, 사용법, 재사용 경로

검색

AI 도구와 사례를 어디서 모아볼 것인가

프로젝트별 웹 협업 공간을 AX 정보 입구로 두고 게시·댓글·검색을 연결

활용

GPU와 모델을 어떻게 배정받는가

RAG 챗봇 추론 분리, 연구용 H200 여력 확대

기록

검증된 지식을 어떤 기준 문서로 남길 것인가

SSOT(Single Source of Truth, 단일 기준 문서)와 AI 색인 범위를 구분

하반기 초안

지식플랫폼팀 2026 하반기 3대 예정 프로젝트

COLLABORATION INFRA

프로젝트별 웹 협업 공간

AI 정보·팁 게시, 댓글·추천 확산, 위키
전환 로그 추적

GPU RESEARCH POOL

공용 GPU 연구활용 확대

RAG챗봇 RTX6000 Pro 이전, H200 4장
연구용 전환

KIMM LLM WIKI

사내 LLM Wiki 역할 설정·시 범 운영

정체성 결정 후 원문(raw), PM 검토,
위키화(ingest)·배포 구조 검증

로드맵

7월부터 12월까지의 하반기 실행 흐름

JUL-AUG

범위와 원칙 결정

- 프로젝트별 협업 공간, 추천 지표, 평가 반영 원천 데이터(raw data) 제공 기준
- RAG챗봇 이전 계획과 공용 GPU 운영 기준안 구체화
- LLM Wiki 정체성: 업무 지침서 / 기관 기록 관리 / 혼합형 중 우선 역할 검토

SEP-OCT

파일럿과 초기 구축

- KIMM-SNS 프로젝트 개설 및 운영 피드백
- RTX6000 Pro 서버 구축, RAG챗봇 이전, GPU 배정 파일럿
- 정체성에 맞춘 원문(raw) 제출·운영 관리자(PM) 검토·위키화 파일럿

NOV-DEC

운영 기준·기획안 확정

- 계정, 권한, 검토자, GPU 부여·회수, 만료 규칙 정리
- published wiki 색인 범위와 AI 활용 기준 점검
- 2027 인프라·플랫폼 기획 초안과 우선순위 정리

후속 보강: 월별 세부 산출물과 담당은 추가 입력 자료를 기준으로 구체화한다.

내년도 기획도 함께 준비

하반기 실행 결과를 내년도 기획 재료로 남긴다

올해는 파일럿을 진행하면서 2027년 인프라·플랫폼 논의에 필요한 근거를 정리

H2 2026

파일럿 실행

KIMM-SNS, GPU Pool, LLM Wiki를 작게 운영하며 수요와 병목 확인

NOV-DEC

기획 초안 정리

운영 로그, 연구자 수요, 제도 보완 필요사항을 내년도 검토 자료로 묶음

2027 REVIEW

추진 여부 검토

내부 절차와 예산 여건을 보며 확대, 보완, 보류할 과제를 구분

H2 MISSION

기획 가능한 형태로 기록

숫자보다 활용 사례, 운영 이슈, 필요한 다음 단계를 남기는 데 초점

PROJECT 1

프로젝트별 웹 협업 공간

게시판·댓글·추천·검색으로 AX 정보
전파. 활동 로그는 내부평가 반영
기준 제안의 원천 데이터(raw data)
로 축적

게시물·댓글

프로젝트별 채널

통합 검색

평가 반영 기준안

KIMM-SNS / AX 정보 공유 프로젝트

검색: RAG, GPU, 논문

PROJECT CHANNELS

AX 논문·사례

최근 댓글 12

RAG 챗봇 사용 팁

추천 많은 글 8

GPU 사용 공지

운영자 고정

LLM위키 원문 후보

운영 관리자 검토 대기 6

SNS-STYLE PROJECT FEED

AI 정보·사용 팁·실패 사례·참고 링크 게시

김연구 · 오늘 09:40 · AX 논문·사례

로컬 LLM 경량화 실험에서 재현 가능한 체크리스트

모델 크기·평가셋·GPU 메모리·실패 케이스를 같은 양식으로 기록

#LLM

#경량화

#재사용

추천 42

댓글 11

위키 후보

박연구 · 어제 16:20 · RAG 챗봇 사용 팁

원내 문서 색인 전 확인해야 할 권한 체크

추천 18

댓글 5

권한 확인

CONTRIBUTION EVIDENCE

제도 기준 제안

내부평가 반영 기준안

기준안

개인별 상한: 최대 5점 검토

원천 데이터

게시·추천·댓글·전파·위키 전환

판단 지원

근거 데이터 산출 / 평가는 별도 절차

안전장치

중복·자기추천·민감정보·악용·이의검토

게시

추천

로그

기준

PROJECT 2

공용 GPU 확대와 운영제도화

RAG 챗봇 추론 워크로드 이전으로 H200 연구자 공용 자원 확대

H200 x8
기존 서버

4 → 8
연구 공용

RTX x3
추론 이전

3대 기준
운영지침(안)



운영지침(안): 자원 단위(1GPU·1MIG·1Block)는 AiDevOPS 지원 정책으로 고정하고, 본부별 수요조사를 실제 운영으로 연결할 배정기준·사용기간·회수조건을 객관화한다.

PROJECT 3

사내 LLM WIKI 운영모델 구상

정체성, 플랫폼, 운영 주체를 먼저 정하고 소규모 파일럿에서 구조를 검증

- 정체성 결정
- 플랫폼 선택
- 운영 주체
- 파일럿 검증

결정해야 할 축

01 정체성

02 운영 플랫폼

03 운영 주체

04 원문 범위

CONCEPT BOARD / DECISION BEFORE PILOT

먼저 정할 질문: 무엇을 위한 Wiki인가?

업무 지침서형

기관 기록형

혼합형

반복 문의를 줄이는 실무 가이드 중심인가?

대표 논의사항

운영 플랫폼

Obsidian only / 웹뷰어 겸용

운영 주체

PM 1인 / 리뷰어 그룹 / 파트별 책임

초기 원문 범위

부안 부단 낮은 가이드.팁부터


- 정체성 결정
- 플랫폼 선택
- 운영 주체
- 파일럿 범위
- 확대 여부 검토

참고: 6개 항목은 기능 메뉴가 아니라 kick-off 이후 합의할 결정축이다. raw는 위키화 전 원문, ingest는 내부 LLM으로 원문을 위키 형태로 변환·색인하는 처리, PM은 프로젝트/운영 관리자를 뜻한다.

LLM WIKI PIPELINE

역할 설정에서 배포본(PUBLISHED WIKI)까지

위키의 정체성을 먼저 정하고, 그 역할에 맞는 원문·검토·배포 흐름을
불인다

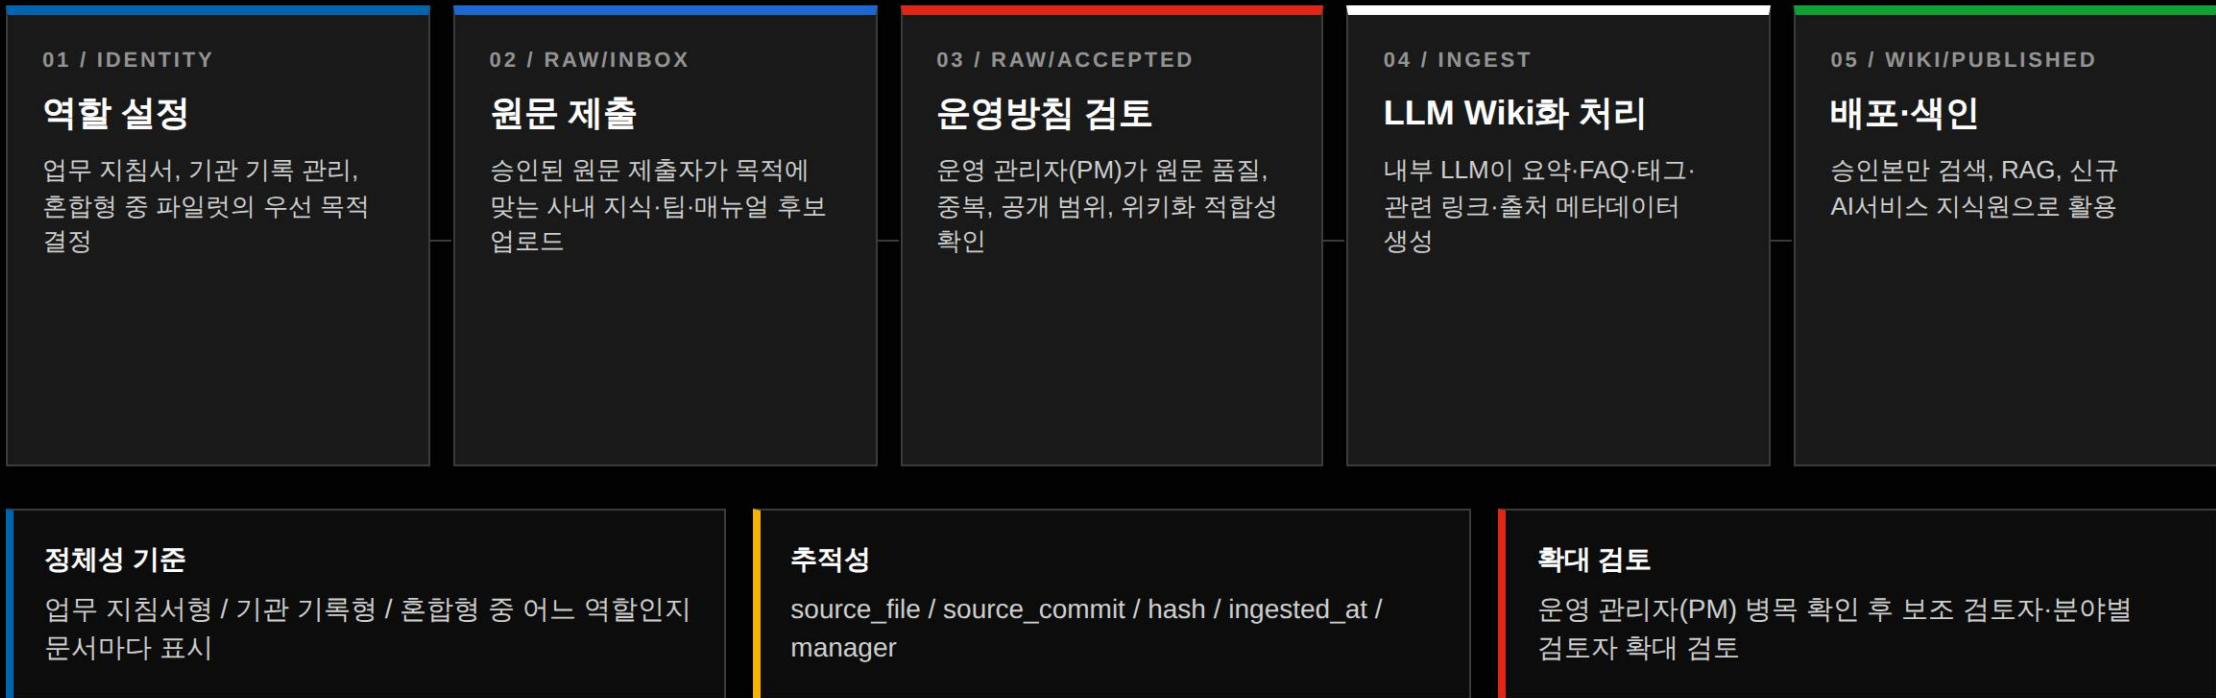

공통 운영 과제

프로젝트별 운영 매트릭스

세 프로젝트에 같은 운영 질문을 적용해 권한, 책임, 측정 기준을 먼저 맞춘다

PROJECT	권한·분류	지원·책임	측정 지표
PROJECT 1 KIMM-SNS	참여 채널, 게시 범위, 내부평가 반영 원천 데이터(raw data) 구분	채널 운영자, 게시 검수, 이의·악용 대응 절차	게시·추천·댓글·전파·위키 전환 로그
PROJECT 2 GPU Pool	사용자 권한, 수요조사 기반 배정 우선순위, 고정 자원 단위 (1GPU·1MIG·1Block)	운영 실무 책임자(DRI), 사용기간, 연장· 회수 조건, 장기 점유 대응	GPU-hour(사용 GPU 시간), 대기시간, 회수·반납 이력, 활용 연구 사례
PROJECT 3 LLM Wiki	원문 제출자(raw committer), 운영 관리자(PM), 위키 열람자, AI 색인 가능 범위	운영 관리자(PM) 중심 위키화(ingest), 보조 검토자 후보, 만료 규칙	원문(raw) 처리량, 반려(reject) 사유, 배포본(published) 전환율

용어 주석: DRI는 Directly Responsible Individual, 즉 운영 실무 책임자다. PM은 이 장표에서는 프로젝트/운영 관리자를 의미하며, 1GPU·1MIG·1Block은 AiDevOPS에서 지원하는 고정 자원 단위다.

자체사업 후보

파일럿 결과를 2027 구축기획으로 전환

하반기 운영 로그와 수요를 기반으로 예산 요구 가능한 구축 과제를
좁힌다

KIMM-SNS

전사 확산 모델

게시 / 추천 / 댓글 / 위키 전환 로그를 기반으로 AX 기여 판단 지원
데이터 표준화

GPU POOL

공용 자원 운영 고도화

배정기준, 사용기간, 회수조건, GPU-hour 산정 기준을 운영지침
(안) 후보로 정리

LLM WIKI

검색·뷰어·자동화

PM 중심 파일럿 결과로 전 직원 검색 UI, Wiki 뷰어, ingest 자동화
필요성 판단

AI-READY DATA

색인 가능한 데이터 기반

published wiki와 승인 문서를 RAG·신규 AI서비스 지식원으로
연결

후속 검토: 금액과 세부 장비 항목은 워킹세션에서 수요·효익·운영 리스크와 함께 구체화한다.

판단 원칙

2027: 예산 요구 / 확대 / 보류 판단

2026 실행 결과를 근거로 자체사업 예산 요구 여부와 우선순위를 검토

BUDGET REQUEST

수요·효익·운영근거가 확인된 자체사업 예산안 후보

EXPAND

배정기준·사용기간·회수조건이 작동하는 공용 GPU 운영제도

FIX OR PAUSE

품질·보안·책임자 불명확 지식 자산

INSTITUTIONALIZE

평가 반영 기준안 / 기여 크레딧 / 리뷰어 / 최신성 점검

연구자 협업 요청

KICK-OFF 이후 함께 정할 논의사항

연구자별 수요·제약과 운영방안을
맞춰야 하반기 실행계획이
선명해진다

KIMM-SNS 촉진

게시 주제 / 추천·댓글 활성화 / 우수
사례 전파 / 위키 전환 방식

WIKI 정체성

업무 지침서 / 기관 기록 관리 / 혼합형
중 파일럿 우선 역할 결정

GPU 운영 기준

워크로드 / 배정기준 / 사용기간 / 연장·
회수 조건 / 문의 채널

파일럿 참여

raw 제출자 / 운영 관리자(PM) / 보조
검토자 / 초기 사용자 후보

팀 업무분장 초안

6개 파트로 나누어 하반기 실행과 내년도 기획을 병행

PMO / 조정

일정·산출물 관리

회의체, 의사결정 기록, 주간 진행상황, 공통
리스크 관리

KIMM-SNS

협업 공간 운영

채널 구조, 게시 주제, 추천·댓글 활성화, 기여
데이터 기준안

GPU POOL

공용 GPU 제도화

이전 일정, 배정기준, 사용기간, 연장·회수 조건,
문의 채널

LLM WIKI 기획

정체성·문서 범위

업무 지침서형 / 기관 기록형 / 혼합형 검토, raw
제출 기준 정리

INGEST·검색

위키화 파이프라인

Obsidian·GitLab 구조, 메타데이터, published
색인, 검색 UI 검토

2027 기획

내년도 논의 자료

운영 로그, 수요, 병목, 우선순위를 기획 초안으로
정리
